

# 「鼓山高中敦品樓 ABC 棟耐震補強工程」(案號 11018)

## 第二次開工前協調會 會議紀錄

時 間：111 年 3 月 14 日（星期一）上午 10 時 10 分

地 點：高雄市立鼓山高級中學 國高中生午餐水果室

出 席：如簽到單

主 席：董總務主任明財

紀錄：呂佳蓁

### 壹、報告事項

1. 請落行執行交通維持、施工圍籬及工地安全，每次上工前危害預防告知。
2. 請依照公共工程施工品質作業要點三級管理制度落實施工檢查，施工廠商應派駐一員品管人員，工程會訂有不預先通知查核機制，契約中並有查核結果品質缺失懲罰性違約金機制，請依機制內容準備相關事項。
3. 施工履約管理請依照契約中施工權責劃分表執行相關業務。
4. 請施工廠商於隱蔽部分施工及每階段灌漿作業於施工前(3 天)向監造廠商申報查驗，並妥善作成查驗紀錄及拍照存證備查。
5. 請施工廠商依契約規定儘速提報工地負責人及品管人員等相關資料。
6. 施工期間若施工廠商對合約圖說有疑義，請於 3 天內提出，請設計監造廠商解釋，以免延誤工程進行。
7. 施工廠商應定期召開職安協議組織會議(會議請事先通知本校及監造廠商)，且請監造廠商督促實行，工程施工期間工地安全衛生管理員應督導有關人員實施巡視、定期檢查、重點檢查、危害通識及作業環境測定。車輛進出工區應有專人交通指揮，並清潔駛出工區車輛輪胎，避免夾帶泥土汙染周遭環境。
8. 施工期間若施工廠商對合約圖書有疑義，應隨時請設

計監造廠商解釋，以免延誤工程進行，各(項)試驗及查驗請確時會同監造廠商辦理，未經查、試驗而逕予施作，將依契約規定嚴加辦理。

9.本工程進行中若因現地或環境因素須辦理變更，請務必事先告知本校並核備程序，使得依本校核備之方式進場施工。

10.本工程之自主檢查表須予量化呈現，於設施檢查後須附上檢查照片，本案須拍攝主要設施同一角度施工前、中、後照片。

11.施工日誌及監造報表須每日按時填寫，並每週送本校備查。

12.本工程依契約規定第一期請於機關通知日起 140 日曆天完工，第一期請於 110 日曆天完工。

## 貳、討論及決議事項

1.承商已完成提送本案施工、品管計畫及材料送審資料等相關文件，並預計 3/15 開工日。請於開工前完成營造綜合保險投保、營建空氣污染防治費申報繳費。

決議：請於開工後二週內完成營造綜合保險投保、營建空氣污染防治費繳費。

2.本校施工區域因學生及鄰近登山客出入，尤須注重施工安全、人員品質，應妥善封鎖工區即全面封閉，不得有吸菸、檳榔及飲酒情形、每日不得遺留垃圾，人員進出宜建立登記：配合政府防疫措施，進校施工人員需造冊，檢附打兩劑 Covid-19 疫苗黃卡證明影本，自 111 年 1 月 1 日起如未接種 Covid-19 疫苗 2 劑且滿 14 天，須由施工單位每週 1 次自費抗原快篩(含家用快篩)或 PCR 檢驗陰性後，始得提供服務。

決議：照案通過。

### 3. 工序確認：第一期靠近教室預計打除期程？

決議：

- (1) 靠近教室部分配合學校教學需求以假期打除為原則，餘由施工單位本權責以整體工徑考量，惟打除期程開始前一週應通知校方，以利及時轉知所屬師生因應。
- (2) 檢附學校 110 學年下學期行事曆 附件 1，相關考試期程以螢光筆標示，請施工單位打除期程俾開考試時間。
- (3) 下午打除開始時間請配合學校時間，於午休結束(1 時 15 分)再開始。
- (4) 3/23-25 為學校第一次段考期間請勿安排打除期程，請承商逕依契約第 7 條提出不計工期之申請。

### 4. 施工督導及協調會議時間

決議：預計 3/23(三)下午 2 時於國高中午餐水果室召開第一次施工協調會議，施工督導會議時間另訂。

5. 本校前以 111 年 3 月 1 日高市鼓中總字第 11170167300 號函轉知，本案為高雄市政府工程施工查核小組預定查核案件，請監造及施作單位預作準備。

決議：照案通過。

### 參、 臨時動議：

1. 開工團拜：訂於 3 月 15 日（二）上午 9 時 30 分。
2. 勵學樓地下室拔河隊練習區安置動線：勵學樓靠近舉重館側汽車停車格(如圖右側)於 3/18(五)下班後封閉，僅保留左側機車停車，原汽車停車格為拔河隊練習區安置區，以乙種圍籬區隔，其費用於變更設計作業中檢討。



3. 配合午餐送餐及無障礙師生，敦品樓一樓工區圍籬廠商請依本日現場決議方式施作**附件 2**，電梯通道預留 1/3 行走，與工區有明確界限無障礙師生通行得免戴工地帽，惟午餐送餐自修繕室坡道前往電梯段會通過工區，仍須配戴工地帽。相關工項數量後續請監造單位進行工程變更設計。
4. ✓**防護員室隔屏**：請校方確認隔屏需求後跟監造及承商回報，以利估價。
5. 敦品樓二樓電梯出口（原校長室及二樓導師室）佈告欄牆面噴塗料：佈告欄不需復原。
6. 監造單位提醒窗戶上氣窗需配合現況施作。
7. 門上窗戶因無開合功能，固展鋁窗已無防猴功能，爰拆除後不復原以求美觀。
8. ✓一樓電梯間與走廊之出入口寬度不足，後續增設木夾板圍籬後，將影響送餐餐車，請廠商先行報價以利評估後續可行性。

散會：111 年 3 月 14 日上午 11 時 20 分。

高雄市鼓山高級中學 110 學年度第二學期重要行事曆 0210

年 月	遇 次	星 期						行 事 要 領	
		日	一	二	三	四	五		
111 年 2 月	1	30	31	1	2	3	4	5	1/31-2/4 春節 2 月學匠國小宣導月 1/24-1/28、2/7-2/9 國三寒假輔導 2/7-10(一-四) 高中部補考 2/9-10(三-四) 高三繁星成績上傳 2/10(四)(1)英檢結果 (2)第一次行政主管會報 2/11(五)開學日(第一節環境整理(發放教科書 (如有需要), 教務期末與學期成績單, 國中補考 通知單), 第二節正式上課) 2/11-18(五-五)友善校園週: 反霸凌反黑反毒宣 導週 2/11(五)(1)仁愛基金、無力支付午餐及教育儲 蓄戶申請開始 3/4 截止。 (2)社宜布置堆疊競賽開始 3/4 截止 2/11(五)高一假期考 (567 節) 2/11-18(五-五)國中部補考 (第八節) 2/15(二)全校朝會 2/16(三)(1)班週會-國高中典禮處理 (2)班會-第 5 節幹部訓練
		1	6	7	8	9	10	11	2/16(三)中午 1200-1300 初校務會議 2/16(三)(1)高三學習歷程檔案座談會 (2)國三技藝班正式開始上課 (3)國高中幹部訓練 2/17-18(四-五)國三模擬考、高二假期考 (學 科測驗) 2/21-2/25(一-五)高三學習歷程檔案彙整 2/21(一)(1)第一次擴大行政會報 (2)國三高一高二輔導課開始 (3)國一國二共山崇學堂開始 (4)晚自習開禁 2/22(二)高中朝會 2/23(三)(1)高中社團 (2)國中班週會-防疫演練(周一、二第 5、6 節) (3)國中部第一節下課跑走廊場活動 2/22-24(二-四)高三第三次模擬考 (分科測驗) 2/24(四) 111 級畢業紀念冊交換截止日 2/26(六) 執上班級家長會(上午 0900-1100)
		2	13	14	15	16	17	18	19
		3	20	21	22	23	24	25	26
		4	27	28	1	2	3	4	5
	5	6	7	8	9	10	11	12	2/28(-)和平紀念日 3/1(二)(1)學測成績公告(2)國中朝會 3/2(三)(1)繁星選填說明會(學生、第五節) (2)運動會報名(國中社團督評) 3/3(四)繁星選填說明會(家長、1900-2100) 3/4(五)(1)健康促進運動會暨社團成果展、生 涯職博覽會 (2)高中筆記比賽收件截止 3/5(六)高雄市國中數學能力競賽 3/7(一)(1)國中學習扶助開始 (2)第二次行政主管會報 (3)教室佈置堆疊競賽評分開始 3/9 止 3/8(二)高中朝會 3/9(三)(1)高中社團 (2)國中班週會-國一類科普講座(2 節) 3/10(四)(1)仁愛基金、無力支付午餐及教育儲 蓄戶審查會議。 (2)午餐供應委員會 3/11(五)下午 1900-2100 家長各員會 3/12(六)國中新生迎學說明會
		6	13	14	15	16	17	18	19
		7	20	21	22	23	24	25	26
		8	27	28	29	30	31	1	2
		9	3	4	5	6	7	8	9
111 年 3 月	6	10	11	12	13	14	15	16	1/2-5(六-二)清明節放假 4/6(三)(1)高中社團 (2)國中班週會-國一性平影片宣導、國 二技藝班說明會 4/6-8(三-五)高一公訓國二露營活動(暫定) 4/7-8(四-五)國三模擬考 4/9(六)升高中美術班術科測驗 4/11(-)第三次行政主管會報 4/12-13(二-三)高三第四次模擬考 (分科測驗) 4/12(二)國中朝會 4/13(三)(1)國中社團 (2)高中班週會-培根偉人楷模圓桌研 討迎新展講座 (3)高三(第 5 節)實彈射擊安全宣教 4/16-19(六-三)全中運(暫定) 4/16(六)跳繩請座(暫訂)
		11	17	18	19	20	21	22	23
		12	24	25	26	27	28	29	30

111 年 5 月	<b>13</b>	1	2	3	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	5月學區國中宣導週 <b>5/4~5/6(三~五)第二次段考(國中前兩天)</b> <b>5/4(三)二次段考(高中社團、國中班週會暫停)</b> 5/7(六)111學年度體育班競賽 5/9(一)第4次行政主管會議 5/9(一)高二3對3加際籃球賽(暫定) 5/9(一)高三車隊藤球比賽(暫定) 5/10(二)國中招會(學聯會攻見發表) 5/11(三)(1)國三色彩折紙活動(第4節全體國三師生) (2)高中社團 (3)高中週會班級活動-高一二課程說明會 5/13(五)國三轉等課結束 5/17(二)(1)高中招會(學聯會攻見發表) (2)學聯會選舉 <b>5/17~19(二、五)高三第五次模擬考(分科測驗)</b>	5/18(三)(1)高三:抽獎抽查:周一、二:社會 (2)高中社團 (3)高中週會-第五節視力保健講座 5/21~22(六、日)國中教育會考 5/23(一)第4次擴大行政會議 5/23(一)國三班際排球比賽(暫定) 5/24(二)(1)國中招會 (2)國三聯絡簿抽查 5/25(三)(1)國一、二:抽獎抽查 (2)第三次學聯會議 (3)高中社團 (4)高中週會班級活動(第5節高中自主學習成果發表) (5)高中週會班級活動-高中深系特更換(第6節) 5/31(二)(1)高中招會 (2)畢業典禮預演(暫定) (3)高三畢業班級頒校(暫定)
	<b>14</b>	8	9	10	11	12	13	<b>14</b>		
	<b>15</b>	15	16	17	18	19	20	<b>21</b>		
	<b>16</b>	22	23	24	25	26	27	<b>28</b>		
	<b>17</b>	29	30	31	1	2	3	<b>4</b>		
	<b>18</b>	5	6	7	8	9	<b>10</b>	<b>11</b>	6/1(三)(1)111級畢業典禮(暫定) (2)高中社團 (3)國中招會-生涯講座(國一二) 6/2~6/10(四~五)中午12時直升八學報到 6/3(五)端午節 6/3~14(五~二)美術班畢業展(文化中心) 6/6(一)(1)第5次行政主管會議 (2)高三畢業班級頒校(暫定)0800~0900 6/8(三)(1)國中社團 (2)高中班週會-高二SDGs 蘭組比賽 (4~7班) 6/13(一)街式滑板全學 1200~1600(周一全年級、406 407 504 506 507) 6/14(二)高中招會 6/15~6/21(三~二)高一高二地圖還修退球(暫定) 6/15(三)下午3時直升八學報榜	6/15(三)(1)第四次學聯會議 (2)高中社團 (3)國中招會 6/16(四)(1)上午9~12時直升八學報到 (2)國一、國二聯絡簿抽查 6/17(五)上午9~12時直升八學報取報到 6/17(五)中午12時前直升八學報到後放棄 6/17(五)國中學習扶助結束 6/20(一)第5次擴大行政會議 6/22(三)(1)國中社團 (2)高中週會班級活動 6/23(四)晚自習結束、崇學堂結束 6/24(五)輔導課結束 6/28~30(二~四)第三次段考(國中前兩天) 6/30(四)第二學期課程結束 6/30(四)期末休業式 15:00~15:30 (環境整理/年級搬遷教室/公積檢點) 6/30(四)期末校務會議(下午15:30) 7/1(五)暑假開始 7/4(一)第6次行政主管會議
111 年 6 月	<b>19</b>	12	13	14	15	16	17	<b>18</b>		
	<b>20</b>	19	20	21	22	23	24	<b>25</b>		
	<b>21</b>	26	27	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	1	2		


學校網址：<http://www.kusjh.kh.edu.tw>

電話：(07) 521-3258

傳真：(07) 521-3259

尺寸 2  
μ.1

鄰棟建物

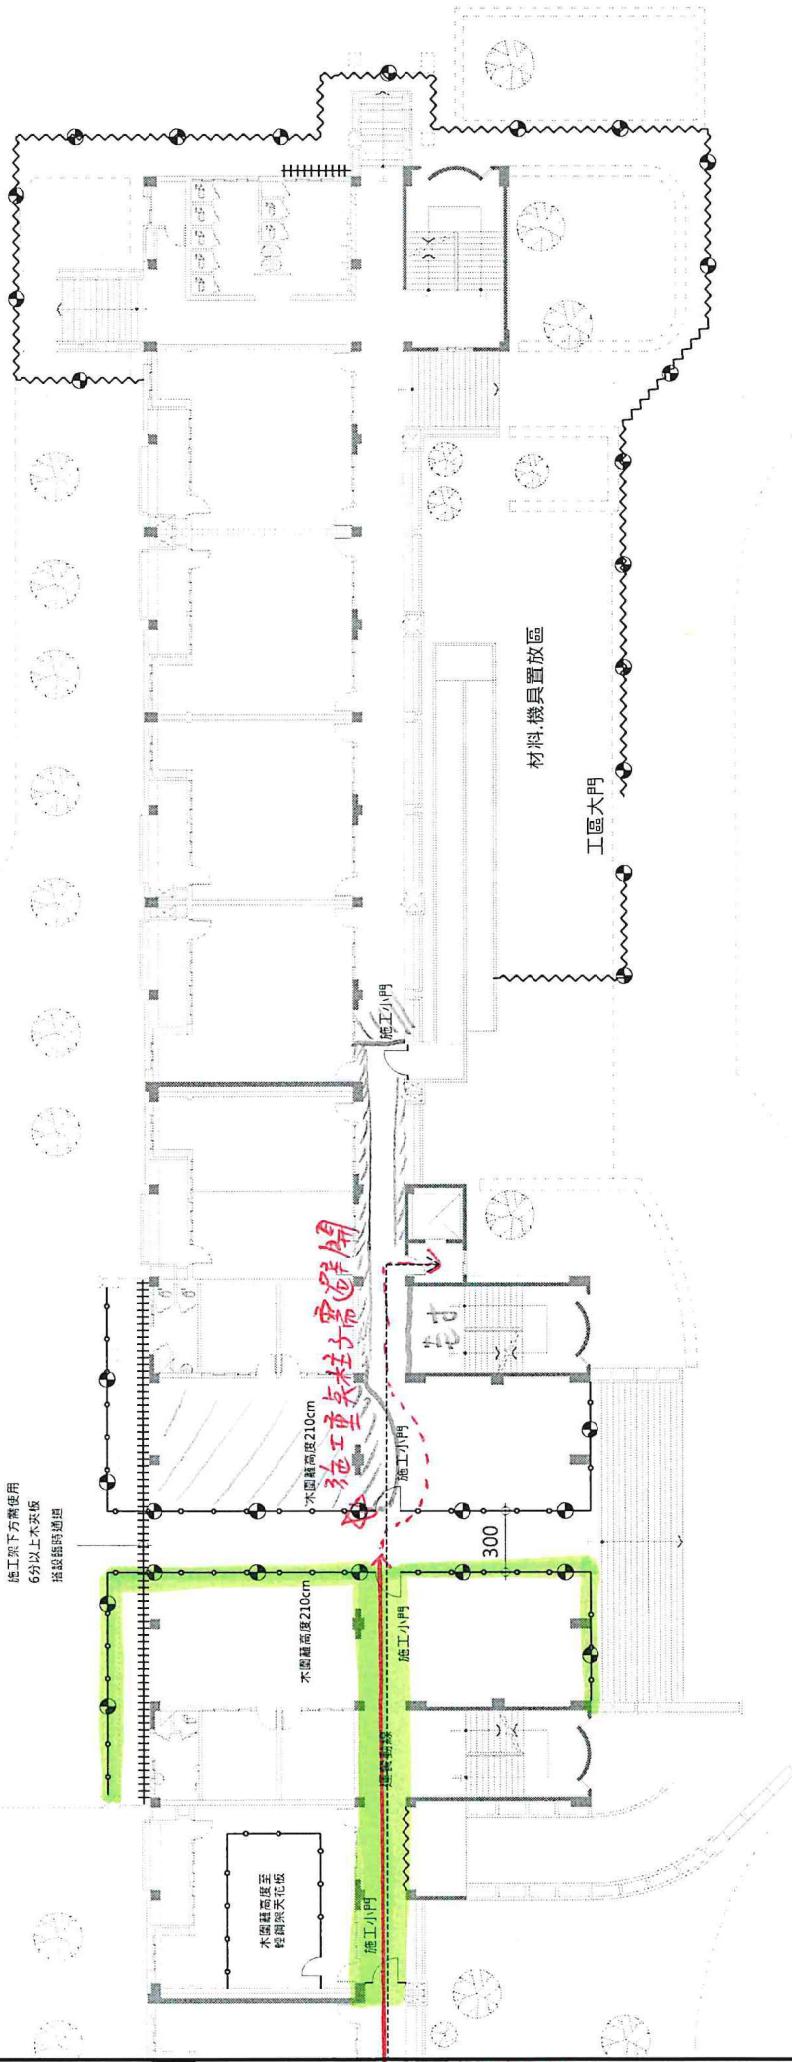

圖例：————塔架位置  
(需鋪設開孔帆布、上下設施)

~~~~~ 甲種圍籬

—— 木圍籬



- 註：1、運動動線僅供參考，須以校方實際需求為主。  
 2、動線上貼標籤並不得放置雜物，需保持餐車通行為原則。  
 3、第一期行動不便坡道及無障礙電梯仍須提供行動不便人員使用，行走路線須保持暢通。

**一層圍籬及施工架範圍圖**

Scale: 1/250 < A3 >

| 版 次 /  | 1       | 修正內容 / | 工程名稱 /                                                                                 | 圖名 /            |
|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 出圖日期 / | 9/24/21 |        | 主辦機關 /<br>地區德達建築事務所<br>地址：新竹市立山高中C1922號<br>聯繫人：周宗翰<br>電話：(03)3325356<br>傳真：(03)3325350 | 第一期 藝術及施工架範圍圖 1 |
|        |         |        | 面積 A0.4                                                                                | 面積 A0.4         |


批註



17/14-2

P.2


圖例：+----- 搭架位置  
+----- 鋼鋸鋪設開孔帆布、上下設施

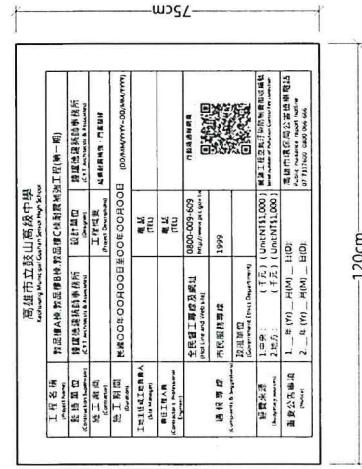

樣式僅供參考，依工程會報新版本為主


#### 注意事項

- 一、工程施作時須配合安全措施及警示燈設備。
- 二、營造廠需視現場自行評估，並於施工計畫書中，規劃施工區之安全圍籬、施工動線、材料堆置區、工區出入口...等。
- 三、圍籬臨時出入口位置，須配合機關需求設置，且臨時門須有管制設備，其費用皆由需求方負擔，不另計費。
- 四、圍籬配置係供參者，需配合校級施工需求設置。
- 五、安全設施佈設，如因損壞或遭失，承包商應具有工程級以上之反光性能。
- 六、交通標誌，其反光面應具有工程級以上之反光性能。
- 七、警示燈至少每5m安裝一组。
- 八、本案施工架數量為施作範圍立面面積，施工過程中若有需增加雙排架、轉折處、上下設備及評估費用。
- 九、施工計畫中需由專任工程人員計算檢核後，並於現場調查及評估後，再施工方式。
- 十、木圍籬以不慎傷害地坪方式設置，若造成損壞需負責修復。
- 十一、教室內設置木圍籬，為堆置該空間既存物品，臨時門須有管制功能，圍籬高度須至頂，降低粉塵飄入。



#### 安全圍籬

米分線色子工區範圍。、相應通道不在工區內，危險工場（三分）  
（讓讓工區及有明確區分）

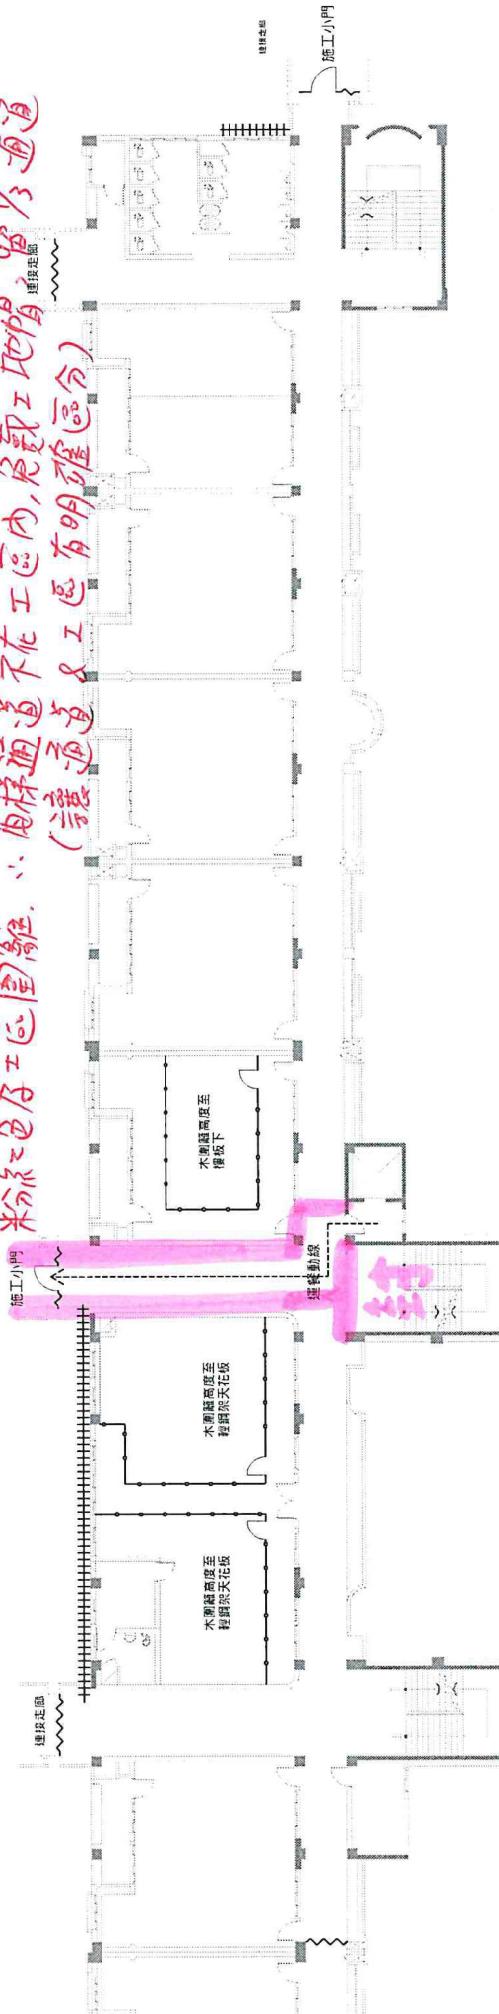


二層圍籬及施工架範圍圖

Scale: 1/250 < A3 >

註：1、運動動線僅供參考，須以校方實際需求為主。  
2、動線上貼標籤並不得放置雜物，需保持暢通為原則。  
3、第一期無障礙電梯仍須提供行動不便人員使用。  
行走路線須保持暢通。

|      |         |       |                                                                        |                                                                        |
|------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 序號   | 1       | 修正內容/ | 工程名稱/                                                                  | 工程名稱/                                                                  |
| 出圖日期 | 9/24/21 |       | 新竹市立泰山高中                                                               | 新竹市立泰山高中                                                               |
|      |         |       | 連絡總經理室事務所<br>新竹市立泰山高中<br>附註：C1972號<br>備註：A1/02132358<br>備註：A1/02132359 | 連絡總經理室事務所<br>新竹市立泰山高中<br>附註：C1972號<br>備註：A1/02132358<br>備註：A1/02132359 |

圖號 A0-4  
圖號 A0-5  
圖號 A0-6  
圖號 A0-7

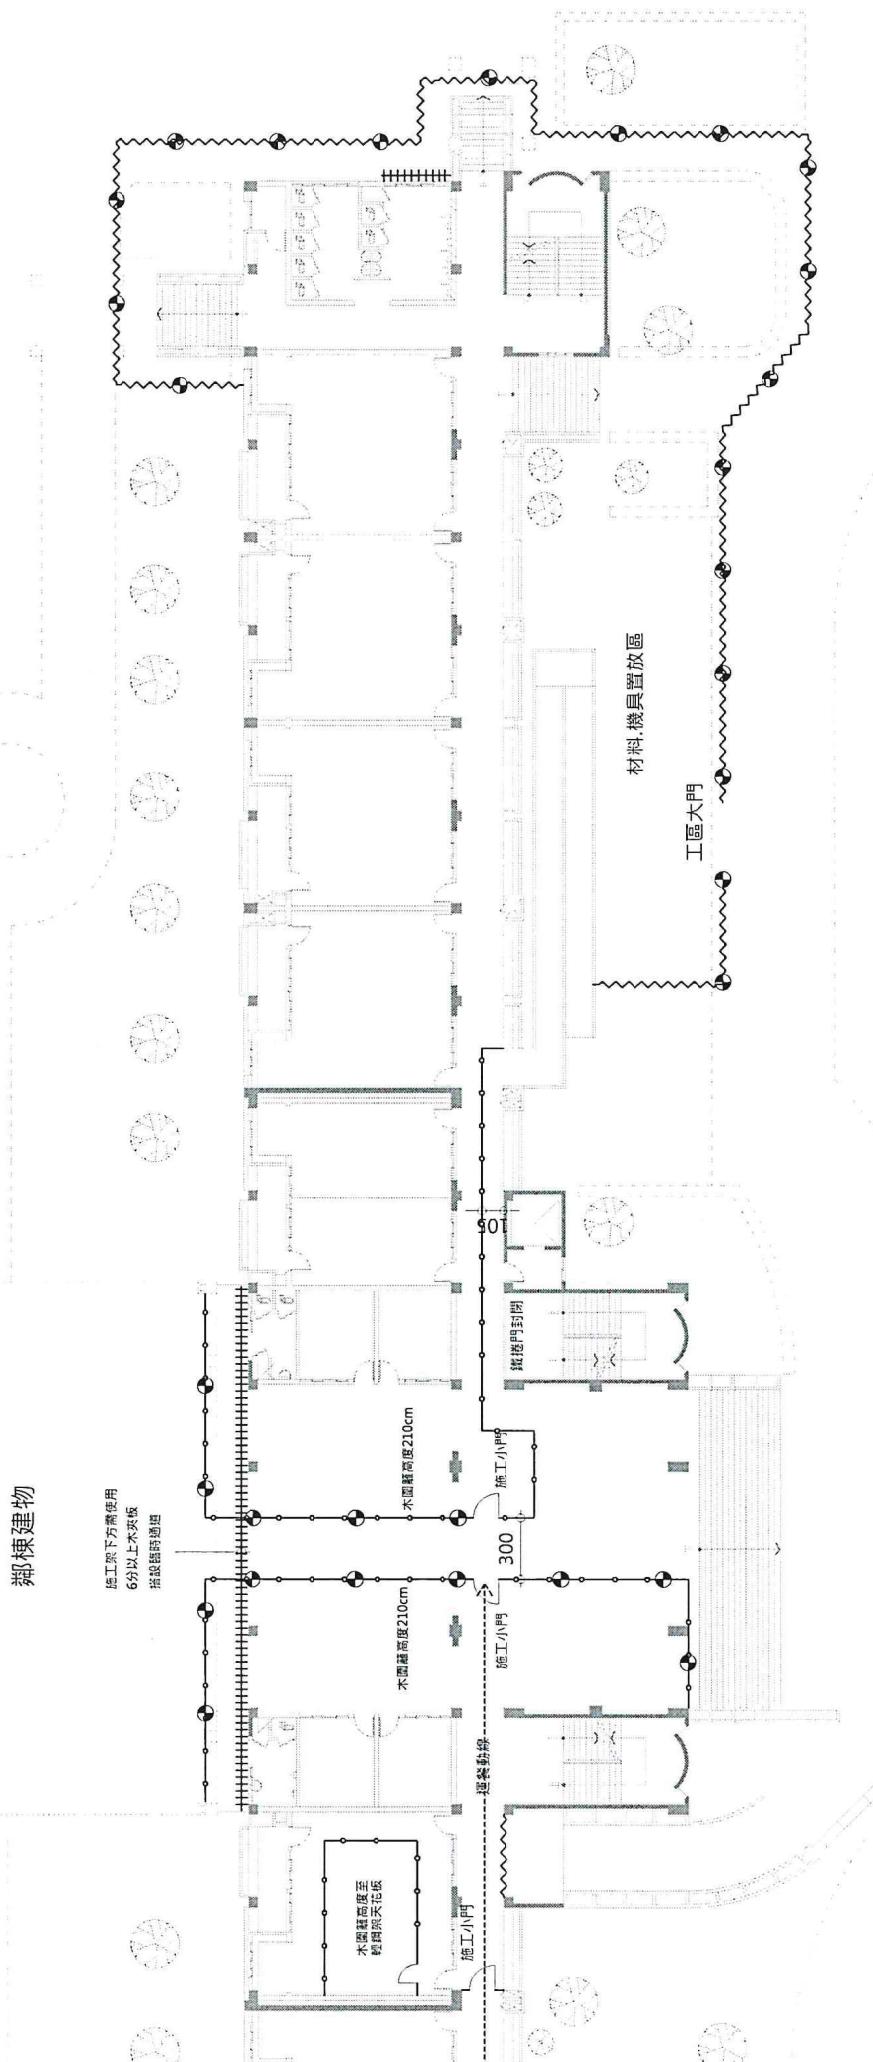

註：1、運輸動線僅供參考，須以校方實際需求為主。

2、動線上貼標籤並不得放置雜物，需保持餐車通行為原則。

3、第一期行動不便坡道及無障礙電梯仍須供行動不便人員使用，行走路線須保持暢通。


(11.3.14修正)

一層圍籠及施工架範圍圖

Scale = 1/250-A3

|       |            |       |                                      |                                      |
|-------|------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 版次/次  | 1          | 修正內容/ | 工程名稱/<br>新屋鄉建總部事務所<br>原萬金高中規畫科C1972號 | 主辦機關/<br>新屋鄉建總部事務所<br>原萬金高中規畫科C1972號 |
| 出圖日期/ | 10/30/2021 |       | 圖樣/A0-4-6#施工架範圍圖1<br>A0-4-6#施工架範圍圖2  | 圖名/<br>第一期 藝文及施工架範圍圖1<br>A0-4<br>張號  |



圖例：+-----+ 搭架位置  
(需鋪設開孔帆布、上下設施) ~~~~~ 甲種圍籬 ◎ 警示燈

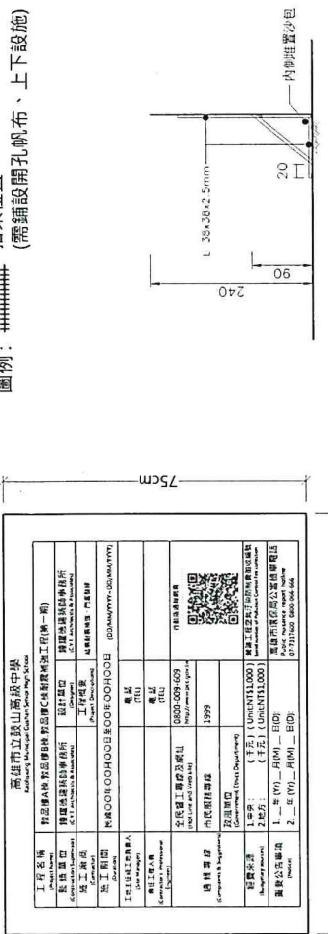

樣式僅供參考，依工程會最新版本為主

### 安全圍籬

- 注意事項  
 一、工程施作時須配合安全措施及營示燈設備。  
 二、營造廠需視現場自行評估，並於施工計畫書中，規劃施工區之安全圍籬、施工動線、材料堆置區、工區出入口...等。  
 三、圍籬臨時出入口位置，須配合機關需求設置，且臨時門須有管制設備，其費用皆含在該工項內，不另計價。  
 四、圍籬設置前供參考，需配合校方及施工需求即調整設置。  
 五、安全設施佈設，如因損壞或遺失承包商應具有工程級以上之反光性能。  
 六、交通標誌，其反光面應具有工程級以上之反光性能。  
 七、警示燈至少每5m安裝一组。  
 八、本案施工架數量為施作範圍立面面積，施工過程中若有需要施作雙排架、轉折處、上下設備或體安需求之相關數量，將不另計價，廠商須至現場調查及評估費用。  
 九、甲種圍籬骨架規格參考，須由專任工程人員計算檢核後，於施工計畫中表達規格、間距...等施工方式。  
 十、木制籬以不損傷地坪方式設置，若造成損壞需負責修復。  
 十一、教室內設置木圍籬，為堆置該空間既存物品，臨時門須有管制功能，圍籬高度須至頂，降低粉塵飄入。

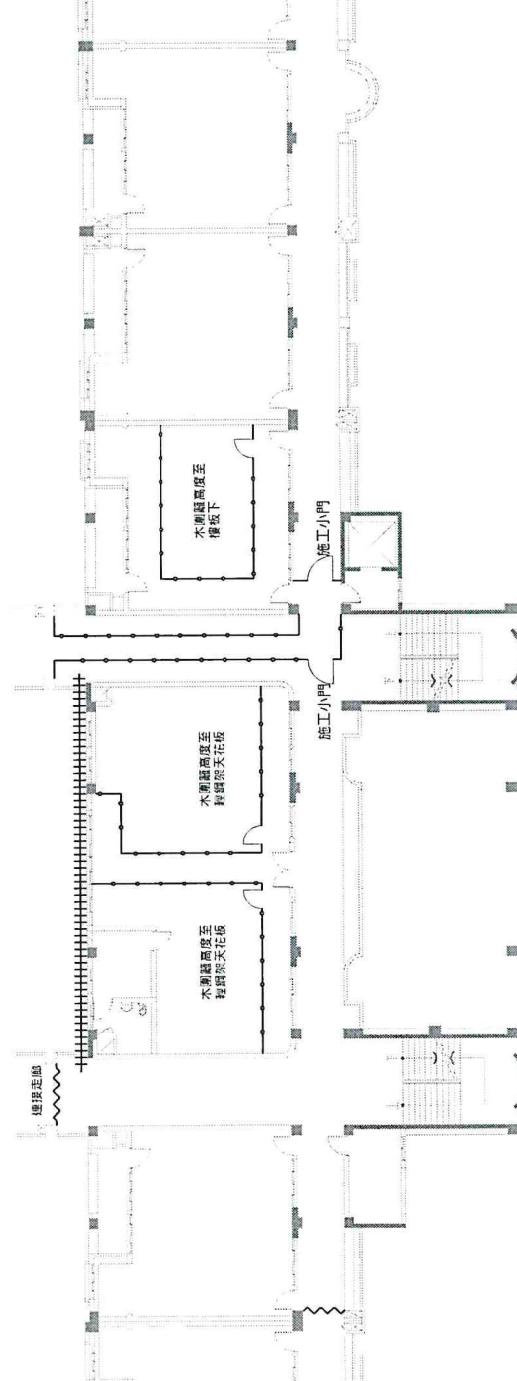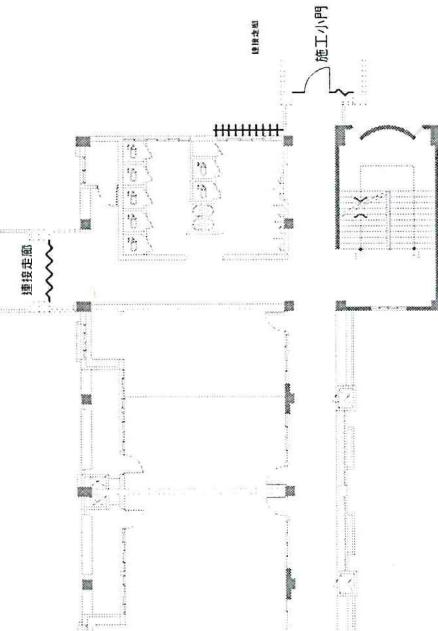


二層圍籬及施工架範圍圖  
111.3.14修正

Scale= 1/250<43,

- 註：1、運動動線僅供參考，須以校方實際需求為主。  
 2、動線上貼標籤並不得放置雜物，需保持通行為原則。  
 3、第一期無障礙電梯仍須提供行動不便人員使用。  
 行走路線須保持暢通。


| 版次/  | 1        | 修正內容/ | 工程名稱/      | 工程說明/                           | 圖名/                         |
|------|----------|-------|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 出圖日期 | 10/30/21 |       | 新竹市立松山高中場地 | 鋪面德建建築師事務所<br>開天窗/屋頂開洞文字於C1972號 | 第一期 藝術及施工範圍圖2<br>A0-4號工段第2頁 |

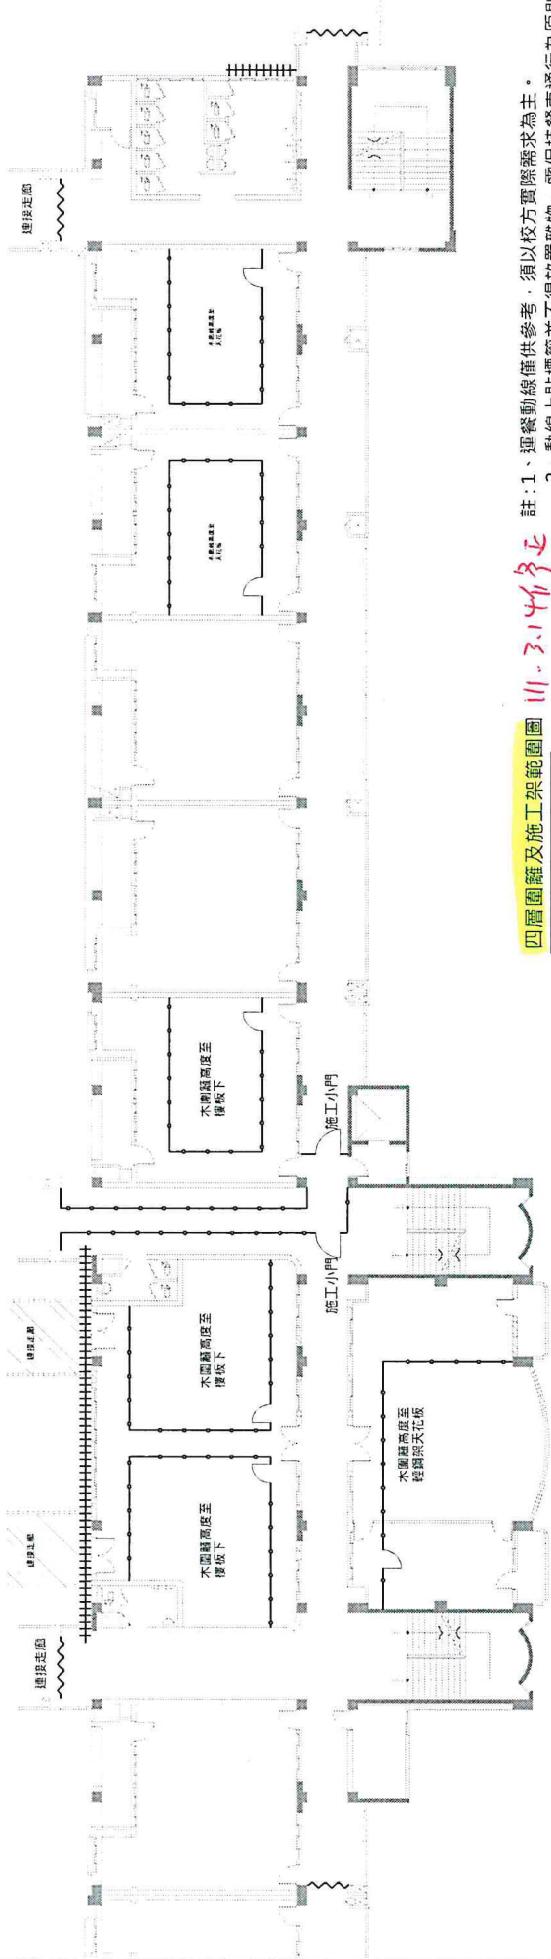

**四層圍籬及施工架範圍圖** 111.3.14修正

Scale= 1/250< A3 >

- 註：1、運輸動線僅供參考，須以校方實際需求為主。  
2、動線上貼標籤並不得放置雜物，需保持餐車通行為原則。  
3、第一期無障礙電梯仍須提供行動不便人員使用。  
行走路線須保持暢通。

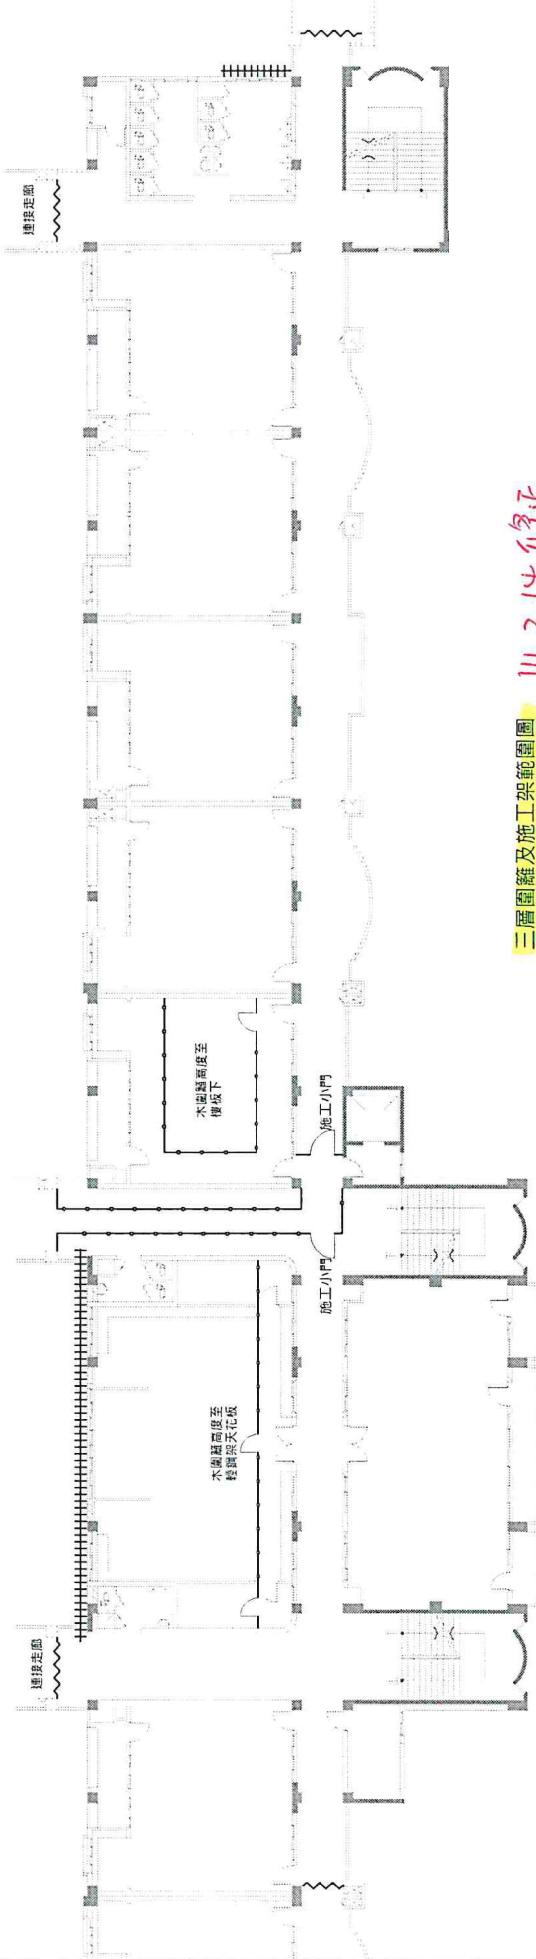

**三層圍籬及施工架範圍圖** 111.3.14修正

Scale= 1/250< A3 >

| 版次/ 1            | 修正內容/ | 工程名稱/ 錦程德建築師事務所<br>新竹市立山高中<br>門禁設施及施工架範圍圖3 | 圖名/ 第一期 藝術施工架範圍圖3 |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------|
| 出圖日期/ 10/30/2021 |       | 圖號 A0-6<br>圖號 A0-6<br>張號                   |                   |

高雄市立鼓山高級中學  
「鼓山高中敦品樓 ABC 棟耐震補強工程」  
第二次開工前協調會議 簽到表

日期：111 年 3 月 14 日上午 10 時 10 分

地點：本校國高中午餐水果室

| 單位(職稱)    | 姓名  | 簽到  | 備註   |
|-----------|-----|-----|------|
| 本校總務主任    | 董明財 | 董明財 |      |
| 本校事務組長    | 呂佳蓁 | 呂佳蓁 |      |
| 鍾耀德建築師事務所 | 鍾耀德 | 鍾耀德 | 監造單位 |
| 仁群營造有限公司  |     | 仁群營 | 施工單位 |
|           |     |     |      |
|           |     |     |      |
|           |     |     |      |
|           |     |     |      |
